SBVB
Syndicat du Bassin Versant du Brivet

POINT GESTION HYDRAULIQUE MOIS DE JUIN 2021

Ce mois de juin a connu des précipitations quasiment deux fois plus importantes que les moyennes saisonnières (79,5mm). Cela a permis de soutenir les niveaux et nous a même conduit à réaliser quelques évacuations par l'ouvrage du Priory en fin de mois du fait des pluies localisées parfois très conséquentes.

Même si nous avons manœuvré certains ouvrages pour pallier l'évolution des niveaux due aux précipitations, l'ensemble de ceux-ci sont en position estivale afin de cloisonner les différents compartiments hydrauliques du bassin versant. En période estivale les compartiments UG1 (Grande Brière Mottière), UG2 (Boulais) et UG3 (Bas Brivet), même s'ils sont cloisonnés, ont sensiblement la même cote. Les différents compartiments hydrauliques du bv sont visibles sur la carte disponible en page suivante.

La cote de niveau d'eau en Grande Brière Mottière était de 0,78m IGN 69 au 1er juin (1,70m cote Brière) pour une même cote votée par la Commission Syndicale de Grande Brière Mottière. Au 30 juin le niveau était de 0,75m IGN 69 (1,67m cote Brière) pour une cote votée par la CSGBM de 0,73m IGN 69 (1,65m cote Brière). Depuis 1998 ce niveau au 1er juillet était toujours inférieur à celui voté par la CSGBM. Il n'a été atteint (ou dépassé) que 8 fois depuis 1956.

Enfin, nous effectuons toujours chaque semaine depuis fin avril, des mesures de salinité à différents endroits du bassin versant qui sont reportés et mis à jour chaque semaine sur notre site internet https://www.sbvb.fr. En raison des pluies plutôt intenses de fin du mois, les concentrations en sel ont de ce fait bien diminué.

Ouvrages	**Observations**
Méan	Vannes fermées
Pont de Paille	Vannes fermées
Rozé Brière	Les portes aval sont maintenues ouvertes et les portes amont laissées libres.
Rozé Brivet	La vanne est ouverte en permanence, toute l'année (elle peut être fermée pour cause de pollution par exemple)
Priory	3 évacuations par la vantelle du 28 au 29
Priory Village	Les portes sont maintenues ouvertes depuis le 11 pour permettre les réalimentations
Boisman	Le clapet est remonté pour cloisonner l'amont de l'aval
Languitre	Les deux vannes sont fermées jusqu'au 30. Ouverture d'une vanne le 30
Pont de la Mine	Partiellement relevé et régulièrement manœuvré pour s'adapter aux variations de niveau
Martigné	Vantelle en surverse du 29 au 30
Hirouse	Une vanne est ouverte
Lavau	Vanne fermée
La Taillée	8 réalimentations ont eu lieu lorsque les coefficients de marée le permettaient
Blanche Couronne	Manœuvrée pour ajustement
Vieux Pont	Fermé, 3 évacuations par l'amont ont eu lieu le 28 et 29
Pouët	Clapet remonté
Harois	La vanne est fermée
Pont de l'Angle	Le clapet est partiellement remonté et manœuvré pour ajustement

Les Unités de Gestion Hydraulique (UGH)

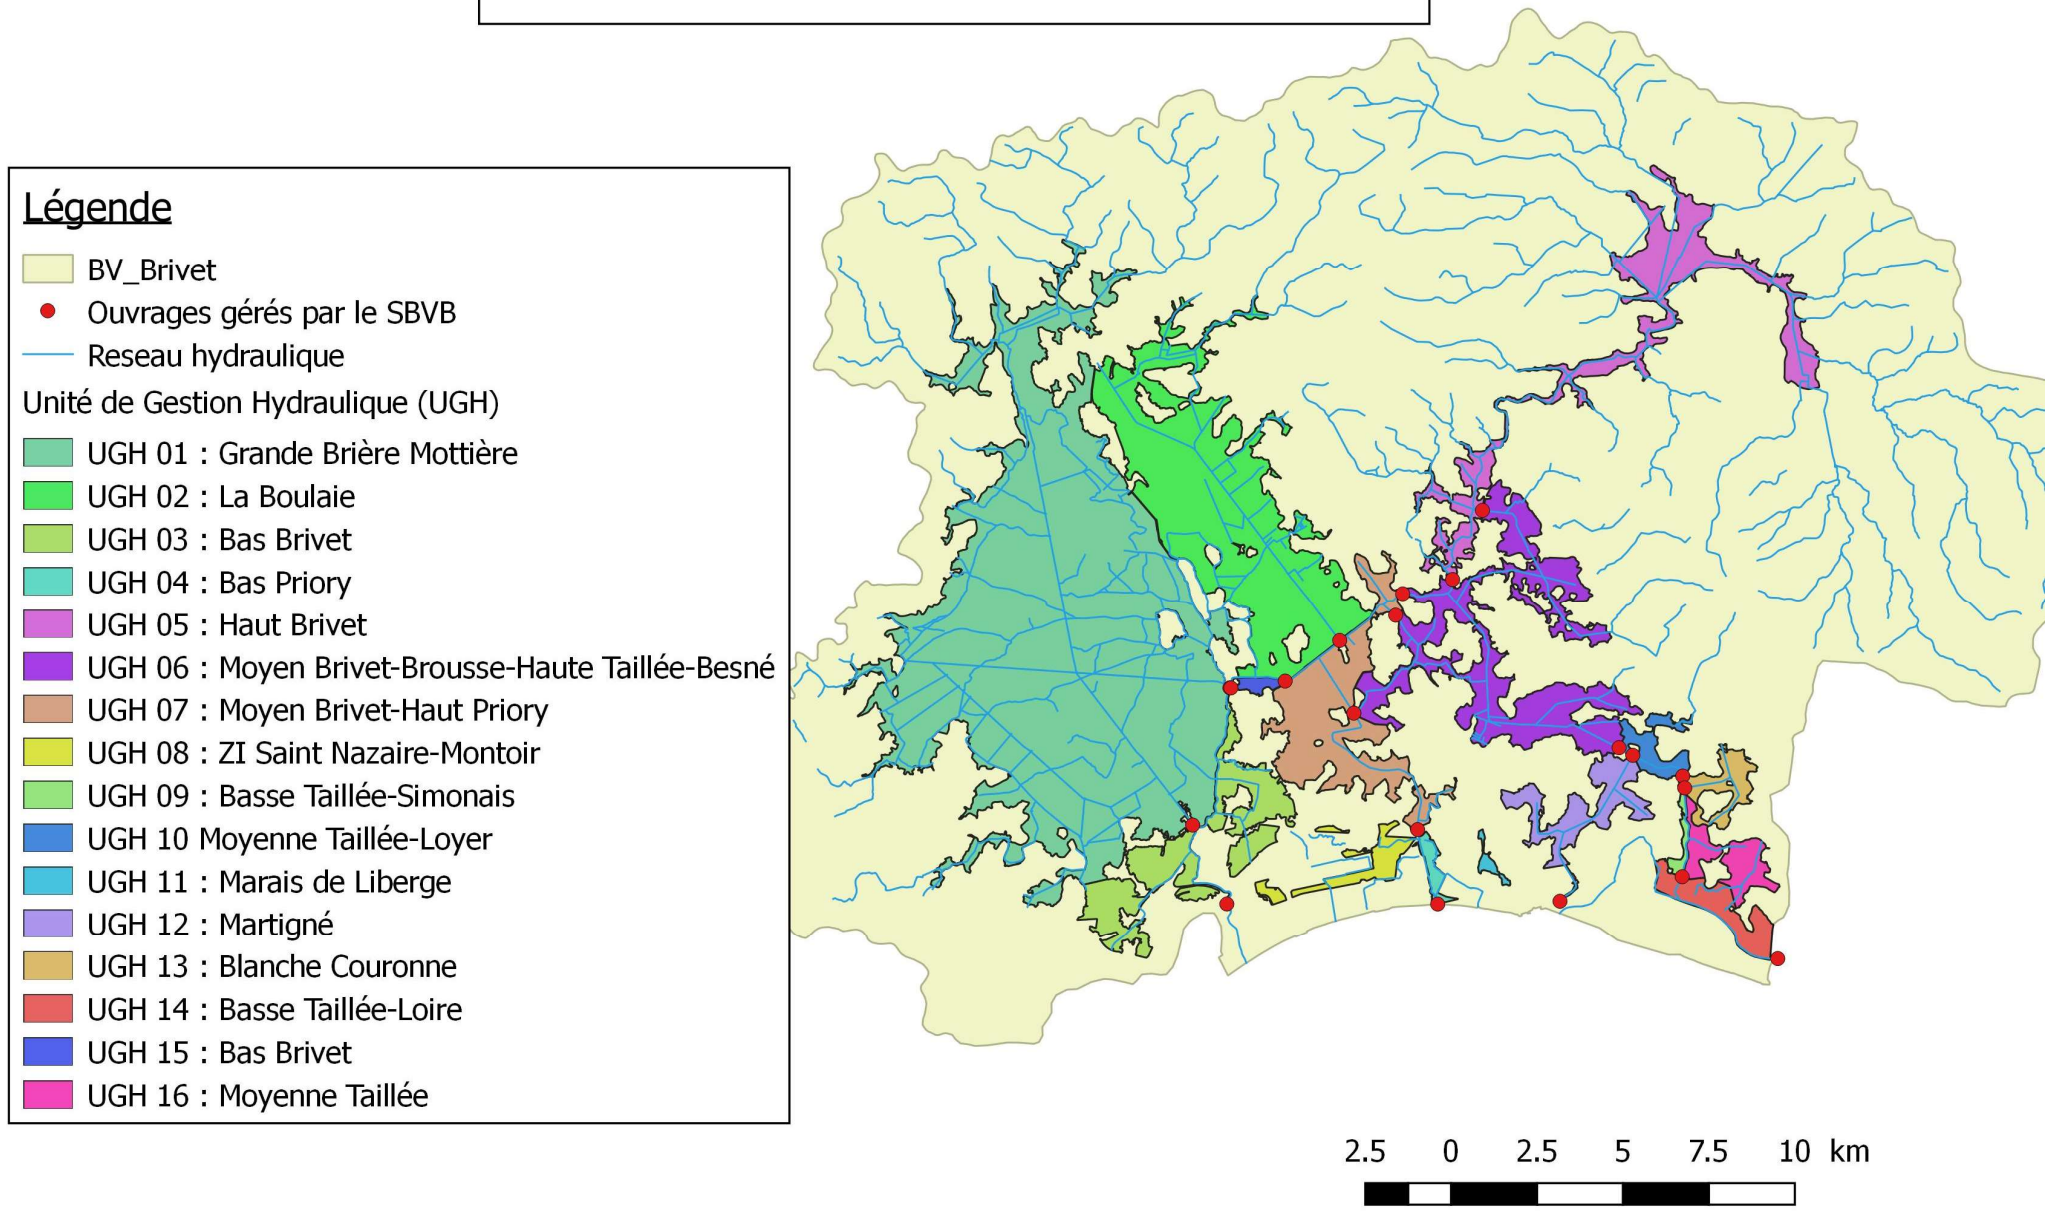

SBVB

Syndicat du Bassin Versant du Brivet
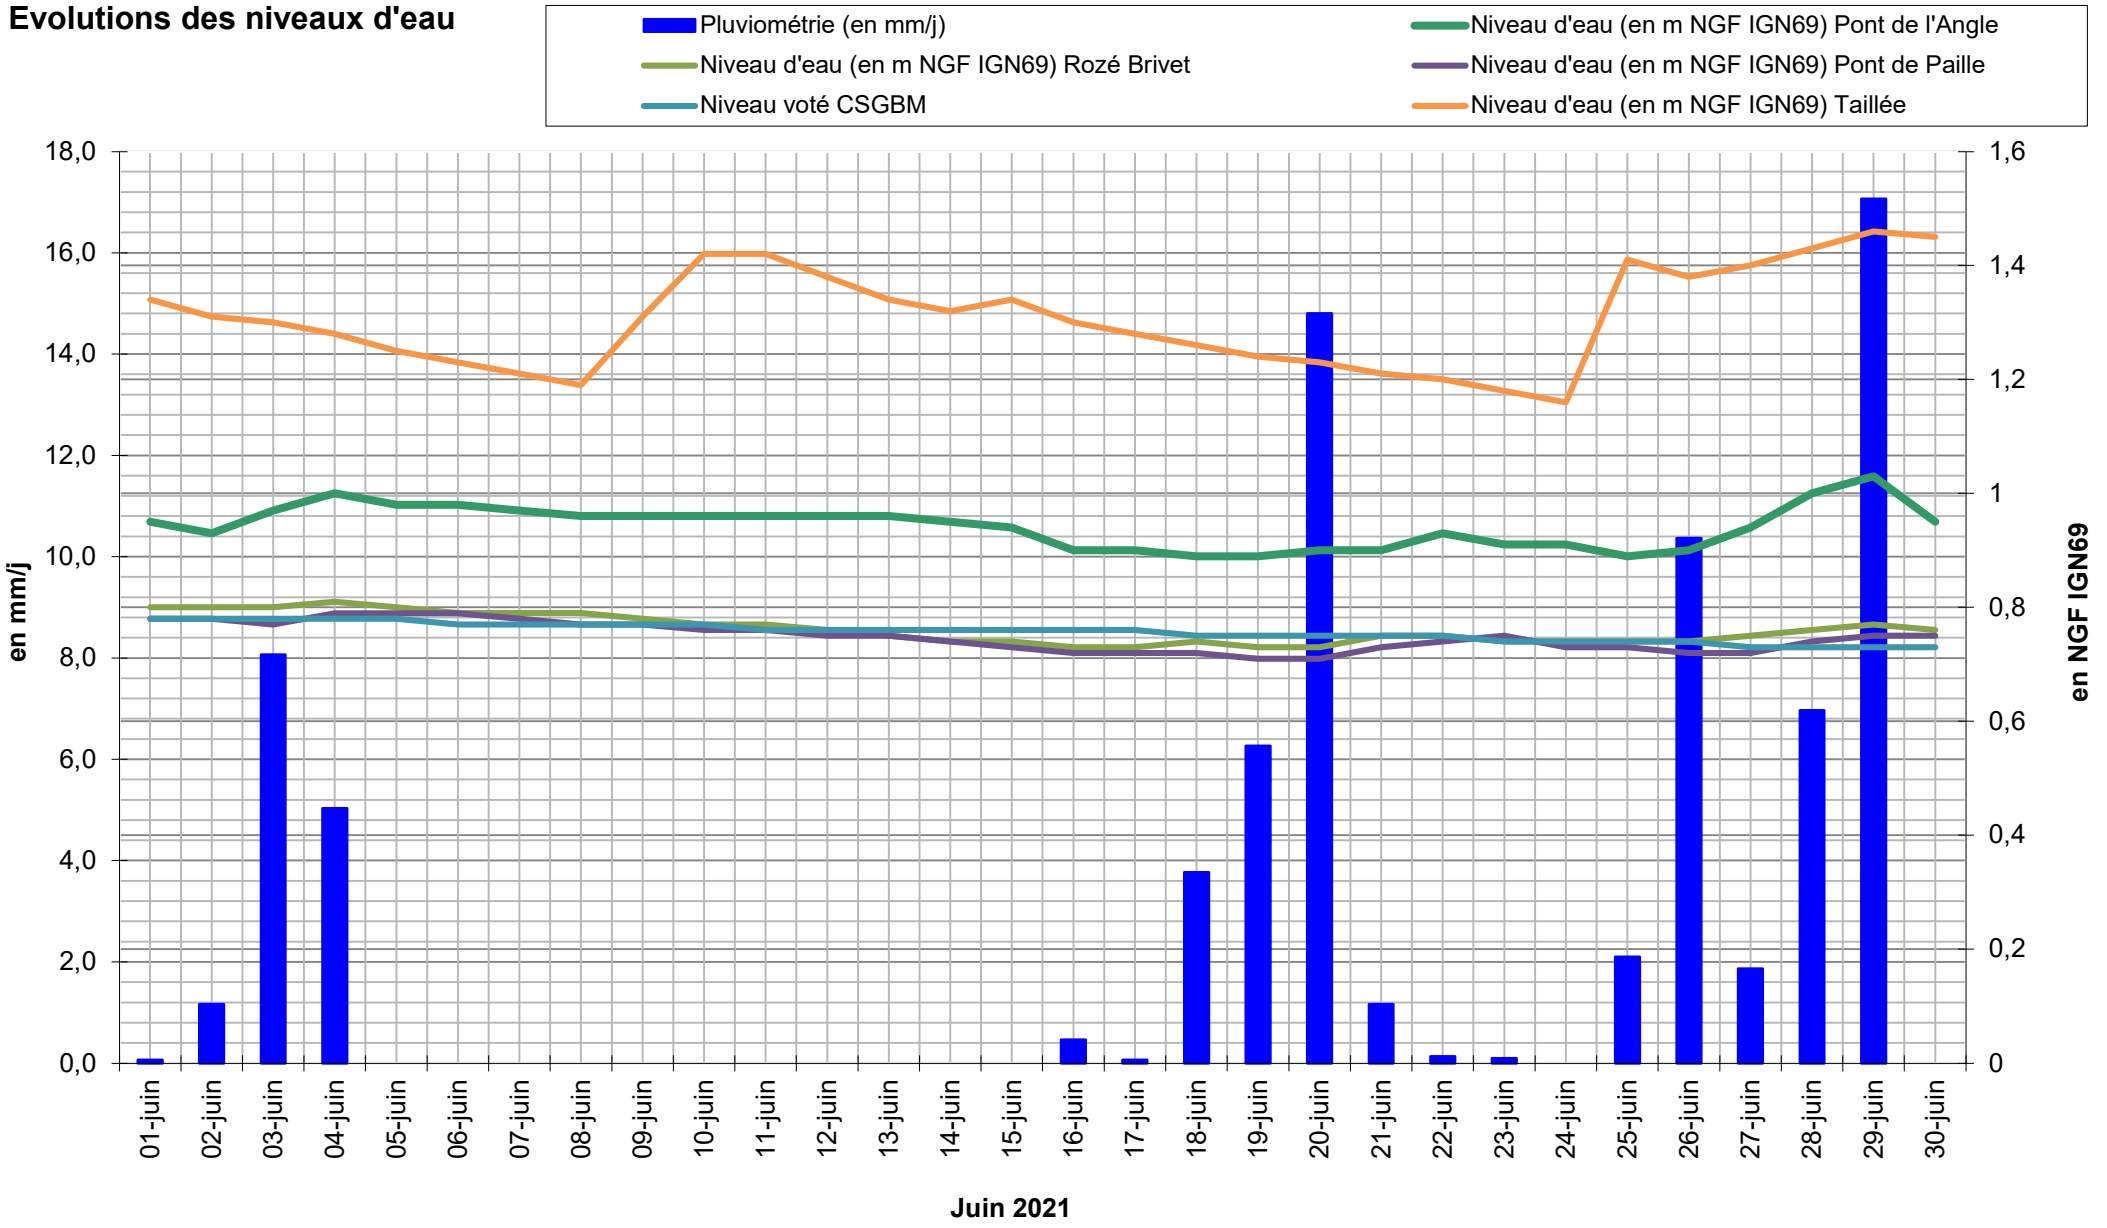
Evolutions des niveaux d'eau
